

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Viborg ½ marathon
Løbsdato : 17. juni
Sted / By : Viborg
Arrangørforening : Viborg AM
Ansvarlig kontaktperson : Brian Andersen
Telefon/E-mail : b_a_061060(snabela)hotmail.com

OPMÅLER

Opmålers navn : Erik Laursen
Adresse : Sandbakken 95
Telefon : 22 78 79 87
E-mail : erik.laursen(snabela) privat.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 17. maj
Distance(r) : 10km og ½ marathon
Tillæg 1 promille : 10m og 21m
Opmålt rute : 10.010m og 21.118,5m

Det bekræftes hermed, at rute(r) til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

20. maj 2017

Erik Laursen

5.6.2017

Peer Jensen

Dato

Opmålers underskrift

Dato

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

Rundstrækning

Punkt-til-punkt

Underlag

Asfalt

Grus

Græs

Sand

Terræn

Bjergløb

Helt flad

Let kuperet

Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0m

Start afmærket

Ja

Nej

Beskrivelse af startsted : på Atletikstadion v/ Idrætshøjskolen. Start/mål på bane 1-4 ved blå mærker 1.hæk 110mh

Mål afmærket

Ja

Nej

Beskrivelse af mål : Som start.

Kilometer afmærket :

Ja

Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300,30m
Sted/vej : vinkelvej.

Før opmåling

Klokken : 17:15
Temperatur : +20

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	186744	190140	3396
2.	190153	193548	3395
3.	193556	196952	3396
4.	196960	200355	3395

Gennemsnit : 3395,5
1000 meter (counts) :
+ 1 promille : 11318,3

Opmålings konstant (counts): 11318,3

Efter opmåling

Klokken :21:30
Temperatur :+20

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	753458	756854	3396
2.	756874	760271	3397
3.	760288	763684	3396
4.	771981	775378	3397

Gennemsnit : 3396,5
1000 meter (counts) :
+ 1 promille : 11321,7

Efterkalibrerings konstant: 11321,7

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KONKLUSION

START og MÅL på 10km ligger på Atletik stadion v 1. Hæk på 110mh. Bane 1-4 benyttes. Der løbes ud fra atletik stadion og drejes mod venstre af Vinkelvej hvor der løbes på cykelstien op til en grøn affaldsspand lige før buskur. Her vendes omkring en kegle og der løbes retur mod syd i den ene kørebane, når atletikstadion passerer løbes der ind på cykelstien. Se øvrige del af ruten på kortet. (Der løbs med uret rundt om Søndersø) Ruten blev opmålt med dette vendepunkt som øje og var da (513047-399234) = 113813 counts hvilket svarer til 10.054m. Vendepunktet rykkes derfor 27m. Så det nu ligger 27m før affaldsspanden nås. Dette udlægges på løbsdagen af arrangør med et målebånd.

START og MÅL på ½ marathon ligger på Atletik stadion v 1. Hæk på 110mh. Bane 1-4 benyttes. Der løbes ud af stadion og op på Vinkelvej mod nord. Vejen følges hele vejen frem til forkanten af indkørsel til Klostermarken 16. Her vendes omkring kegler og der løbes retur mod atletik stadion på cykelstien. (Der løbes med uret rundt om Søndersø)Resten af ruten ses på kortet. Begge ruters sidste c. 6km er sammenfaldende. Ruten blev målt til (750500-513060) = 237440 counts hvilket svarer til 20.975,3m hvilket er 122m for kort. Vendepunktet på Vinkelvej flyttes derfor 61m længere væk fra stadion. Udlægges med målebånd af arrangør på løbsdagen.

INGEN korrektion for kalibreringsstrækningen da temperaturen da den blev lagt ud var 20 grader.

Vi startede med at måle ½mar ruten op og var forbi 15km punktet da jeg opdagede at Jones counteren havde mistet forbindelsen til egeren som den var spændt fast på. Altså måtte jeg køre turen igen efter vi havde målt 10km ruten op. Derfor den lange afstand mellem kalibreringen og den først viste opmåling. Men da aftenen bare var fantastisk havde det ikke nogen betydning udover at der blev kørt nogle ekstra kilometer.

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk


Tlf.: +45 4326 2308



KORT OVER OPMÅLTE RUTE

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308

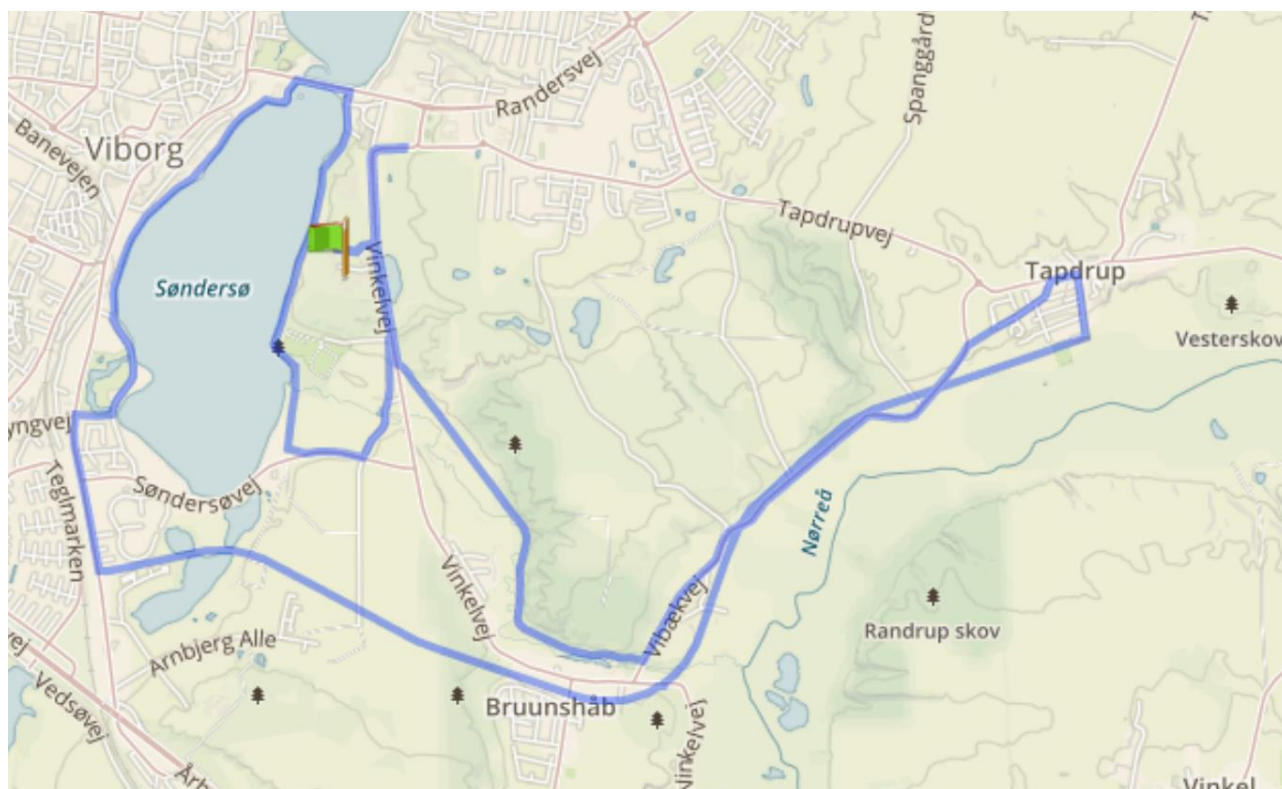

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-opmåling

